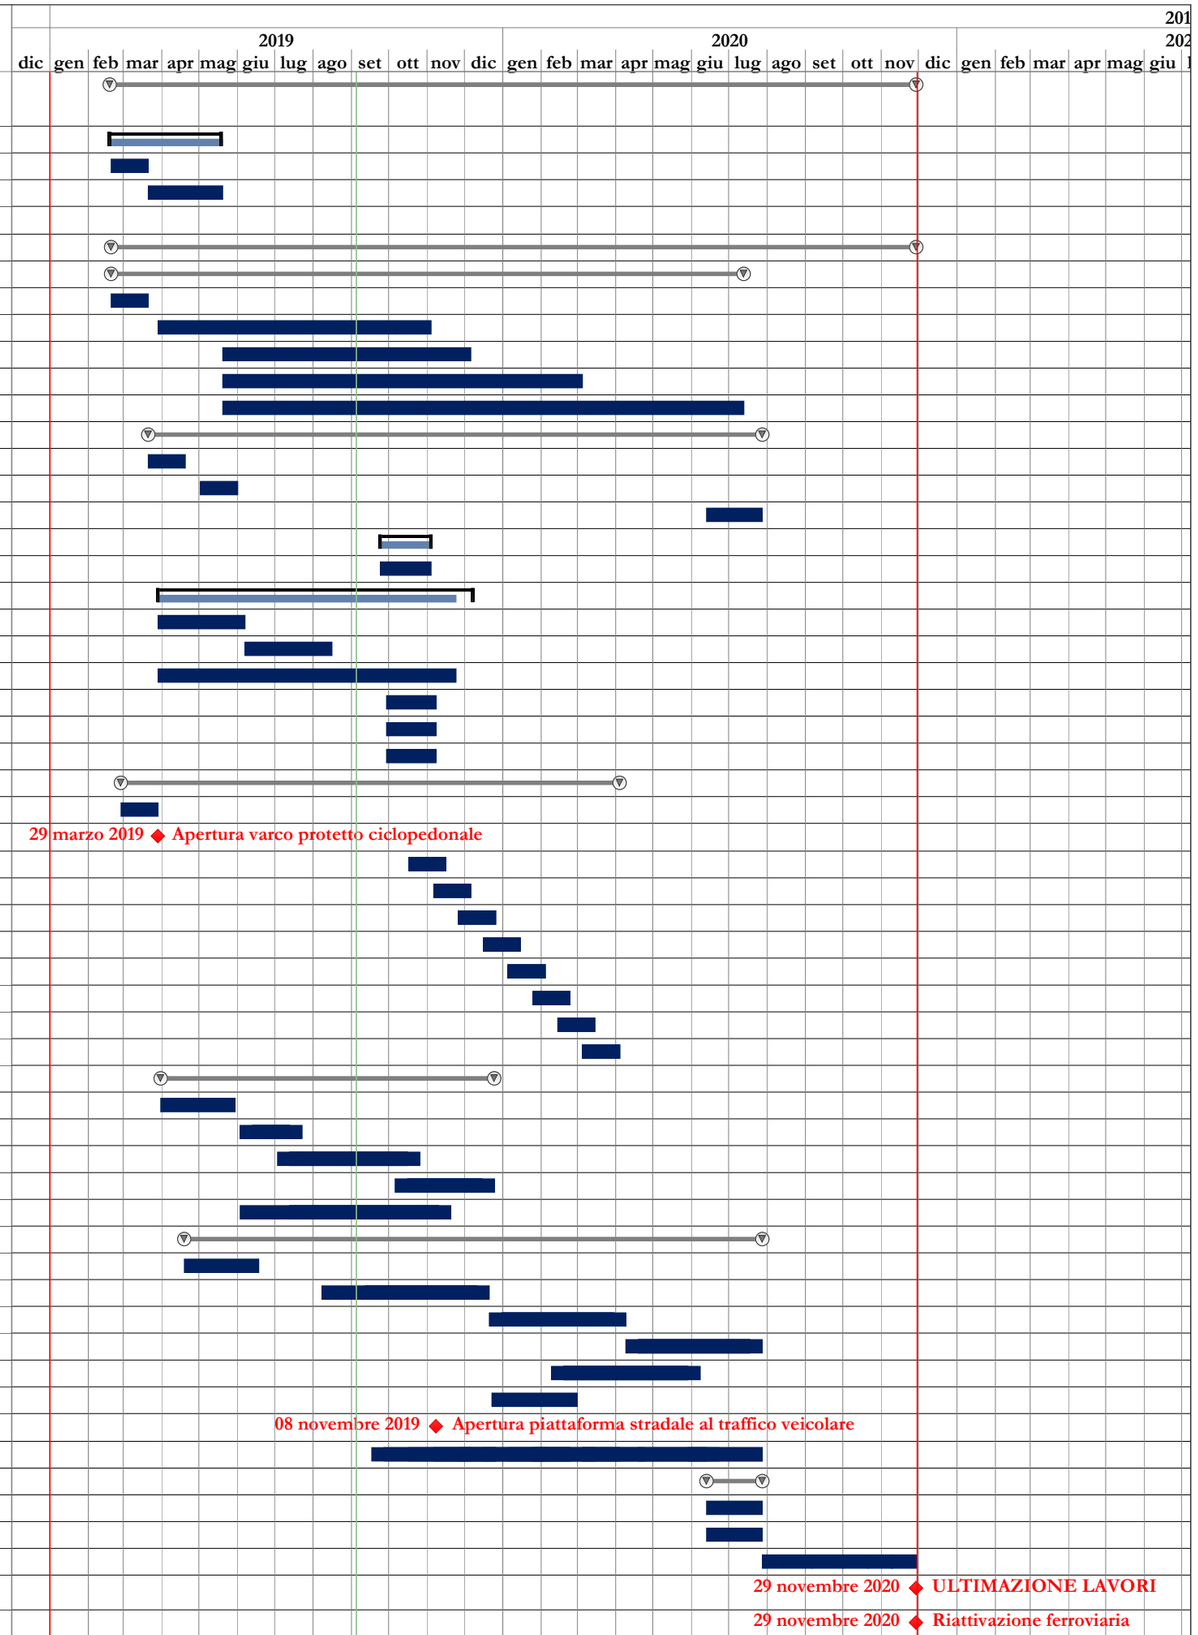Nome attività	Durata	Inizio	Fine
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SAN MICHELE A PADERNO D'ADDA	**650 g**	**lun 18/02/19**	**dom 29/11/20**
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	**90 g**	**lun 18/02/19**	**dom 19/05/19**
Redazione progettazione esecutiva	**30 g**	**mar 19/02/19**	**gio 21/03/19**
Approvazione progetto esecutivo e redazione progetto di dettaglio	**60 g**	**gio 21/03/19**	**lun 20/05/19**
Completamento consegna lavori appalto principale restauro travate, arco e pile	**0 g**	**lun 20/05/19**	**lun 20/05/19**
LAVORI	**649 g**	**mar 19/02/19**	**dom 29/11/20**
CANTIERIZZAZIONE	**510 g**	**mar 19/02/19**	**lun 13/07/20**
Cantiere piattaforma stradale (riveniente da precedente appalto)	*30 g*	*mar 19/02/19*	*gio 21/03/19*
Cantiere piattaforma stradale (aperta a pedoni e cicli)	220 g	ven 29/03/19	lun 04/11/19
Cantiere piattaforma ferroviaria (travata)	200 g	lun 20/05/19	ven 06/12/19
Cantiere su fondazioni arco e pile	290 g	lun 20/05/19	gio 05/03/20
Nuove piste di cantiere (incluso ripiego e sistemazione)	420 g	lun 20/05/19	lun 13/07/20
RILIEVI E INDAGINI INTEGRATIVE	**495 g**	**gio 21/03/19**	**mar 28/07/20**
Realizzazione dei rilievi topografici delle sponde	30 g	gio 21/03/19	sab 20/04/19
Indagini Geognostiche integrative	30 g	gio 02/05/19	ven 31/05/19
Monitoraggio integrativo	45 g	sab 13/06/20	mar 28/07/20
BONIFICA BELLICA	**41 g**	**mar 24/09/19**	**lun 04/11/19**
BOE piste di cantiere e aree di cantiere	**41 g**	**mar 24/09/19**	**lun 04/11/19**
RIFACIMENTO PIATTAFORMA STRADALE	**254 g**	**ven 29/03/19**	**sab 07/12/19**
Rinforzo o sostituzione mensole ammalorate (completamento da precedente appalto)	70 g	ven 29/03/19	ven 07/06/19
Posa pietre marciapiedi e scarichi acque (completamento)	70 g	ven 07/06/19	ven 16/08/19
Restauro parapetto e posa barriera	240 g	ven 29/03/19	dom 24/11/19
Giunti d'impalcato e pavimentazione in conglomerato bituminoso	40 g	dom 29/09/19	ven 08/11/19
Posa barriera stradale	40 g	dom 29/09/19	ven 08/11/19
Posa segnaletica	40 g	dom 29/09/19	ven 08/11/19
RESTAURO E RINFORZO TRAVATA	**402 g**	**mer 27/02/19**	**sab 04/04/20**
Fase propedeutica interventi aste per apertura ciclopedonale (avviata su precedente appalto)	*30 g*	*mer 27/02/19*	*ven 29/03/19*
Apertura varco protetto ciclopedonale	**0 g**	**ven 29/03/19**	**ven 29/03/19**
Trave 1	**30 g**	**gio 17/10/19**	**sab 16/11/19**
Trave 2	**30 g**	**mer 06/11/19**	**ven 06/12/19**
Trave 3	**30 g**	**mar 26/11/19**	**gio 26/12/19**
Trave 4	**30 g**	**lun 16/12/19**	**mer 15/01/20**
Trave 5	**30 g**	**dom 05/01/20**	**mar 04/02/20**
Trave 6	**30 g**	**sab 25/01/20**	**lun 24/02/20**
Trave 7	**30 g**	**ven 14/02/20**	**dom 15/03/20**
Trave 8	**30 g**	**gio 05/03/20**	**sab 04/04/20**
RESTAURO E RINFORZO PILE	**269 g**	**dom 31/03/19**	**mer 25/12/19**
Fase propedeutica interventi	**60 g**	**dom 31/03/19**	**gio 30/05/19**
Pila 7	**50 g**	**lun 03/06/19**	**mar 23/07/19**
Pile 2 - 5	**115 g**	**mer 03/07/19**	**sab 26/10/19**
Pile 3 - 4	**80 g**	**dom 06/10/19**	**mer 25/12/19**
Pila 1 - 6	**170 g**	**lun 03/06/19**	**mer 20/11/19**
RESTAURO E RINFORZO ARCO	**466 g**	**ven 19/04/19**	**mar 28/07/20**
Fase propedeutica interventi	**60 g**	**ven 19/04/19**	**mar 18/06/19**
Tratto tra pile 1 e 2	**135 g**	**gio 08/08/19**	**sab 21/12/19**
Tratto tra pile 2 e 3	**110 g**	**sab 21/12/19**	**gio 09/04/20**
Tratto tra pile 3 e 4	**110 g**	**gio 09/04/20**	**mar 28/07/20**
Tratto tra pile 4 e 5	**120 g**	**dom 09/02/20**	**lun 08/06/20**
Tratto tra pile 5 e 6	**69 g**	**lun 23/12/19**	**sab 29/02/20**
Apertura piattaforma stradale al traffico veicolare	**0 g**	**ven 08/11/19**	**ven 08/11/19**
NUOVE ACCESSIBILITA' E LINEE VITA	**315 g**	**mar 17/09/19**	**mar 28/07/20**
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	**45 g**	**sab 13/06/20**	**mar 28/07/20**
Sistemazione piste di cantiere	45 g	sab 13/06/20	mar 28/07/20
Rinverdimento piazzole e scarpate	45 g	sab 13/06/20	mar 28/07/20
COLLAUDI TECNICI PER RIATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE FERROVIARIA	**124 g**	**mar 28/07/20**	**dom 29/11/20**
ULTIMAZIONE LAVORI	**0 g**	**dom 29/11/20**	**dom 29/11/20**
Riattivazione ferroviaria	**0 g**	**dom 29/11/20**	**dom 29/11/20**
